


« Rénover l'équipement des salles de classe et  
agrandir le centre d'éveil du programme Farlu »,  
Sénégal

## Résultats et impacts

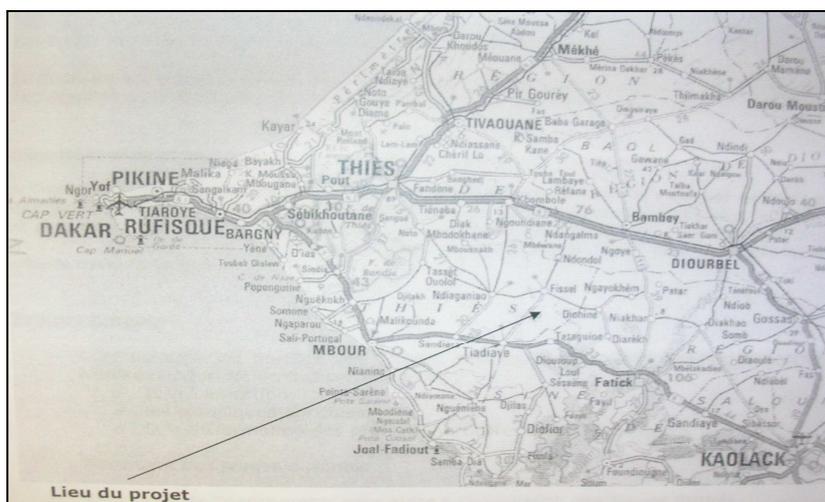

Lieu d'implantation du projet : **Ecole Élémentaire de Tattaguine Sérère, Sessène**

Date de début du projet : **Février 2008**

Durée : **3 mois**

Objectifs : **Améliorer les conditions d'études des enfants**

Nombre de bénéficiaires : **345 élèves et leurs enseignants**

Financement : **3 396 €**

## 1. Activités réalisées

Dès réception des fonds par CCF – Sénégal, le 14 février 2008, l'ensemble des activités prévues ont pu être lancées.

- Tout d'abord, le conseil d'administration de l'association s'est réuni pour donner l'autorisation d'exécution du projet, sélectionner le fournisseur du matériel, les ouvriers pour la construction et pour la confection du mobiliers et des tables – bancs.

Plusieurs rencontres réunissant le corps enseignant de l'école, les parents et le chef de village, ont permis de diffuser des informations relatives au projet et de mettre en place un comité de réception du matériel (composée des enseignants et du trésorier du centre d'éveil). Enfin, le matériel de construction a pu être acheté et transporté sans difficultés.

- Concernant le mobilier scolaire, la première étape a consisté à effectuer le recensement des tables – bancs ayant besoin de réfections. De nouvelles tables – bancs pour l'école élémentaire ont été commandées, et le mobilier abimé a été rénové.

De même, les commandes de tables-bancs, de bureaux et de chaises pour le centre d'éveil ont été effectuées en fonction des besoins établis.

- Après construction du bâtiment et installation du mobilier, tout a pu être réceptionné par le conseil d'administration de l'association, le corps enseignant et des représentants des autorités locales.

## 2. Résultats obtenus

Pour l'école élémentaire :

- La classe de Cours Initiatique (CI, 6-7 ans) est aujourd'hui dotée de 25 nouvelles tables-bancs. Le reste du mobilier est réparé.

- Grâce au projet, les conditions de travail des 345 élèves et des 7 enseignants de l'école élémentaire ont été améliorées.

Pour le centre d'éveil :

- Un nouveau centre d'éveil est construit. Il est doté de mobilier scolaire adapté : 15 tables-bancs pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, un bureau et 2 chaises. Les 38 élèves ne s'assoient plus par terre à présent.

- Les enfants et leurs deux animatrices polyvalentes travaillent dans de bonnes conditions.

Grâce aux réalisations de ce projet, l'école a fait peau neuve. Le conseil d'administration de l'association a profité de ces initiatives pour lancer en parallèle la rénovation de deux salles de classe fortement dégradées, faire construire deux latrines de deux cabines chacune et réparer le mur de clôture.

Les enseignants et les élèves seront en charge de l'entretien des locaux.

**•Photos prises avant la mise en œuvre du projet :**



**Le centre d'éveil**



**Une des salles de classe de l'école**

**•Photos des résultats du projet :**



**Salles de classes équipées de matériels neufs et rénovés.**



**Le centre d'éveil, vues de l'intérieur et de l'extérieur.**


### 3. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées ont été les suivantes :

- Un contrôle de l'état du bâtiment du centre d'éveil, effectué par un technicien du bâtiment, a montré qu'agrandir le centre initial diminuerait sa durée de vie. Le conseil d'administration a donc décidé de modifier le projet en remplaçant la rénovation du centre initialement prévue par la construction d'un nouveau bâtiment. Face à la légère augmentation du budget que cette décision a entraîné, le conseil d'administration a accepté de compléter la somme prévue à l'origine.
- Les prix du ciment et du fer ont subi une forte inflation. Entre le moment de rédaction du budget prévisionnel et le moment d'achat des matériaux, les prix sont passés de 70 000 CFA à 73 000 CFA la tonne pour le ciment, et de 39 000 CFA à 42 500 CFA pour 100kg de fer.
- la supervision des travaux, à la charge de l'équipe enseignante a été perturbée par les grèves répétées des enseignants.

### 6. Témoignages

#### • Le Directeur de l'école élémentaire de Tattaguine Sérère

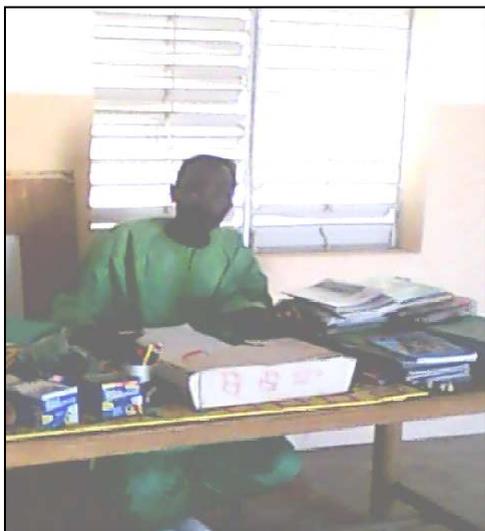

« La confection et la réfection de tables bancs opérées grâce à ce projet ont positivement amélioré les conditions d'apprentissage des élèves dans notre école. Les élèves de CI qui étaient assis à trois par table banc s'assoient maintenant à deux. Ceci contribue positivement à faciliter les exercices de comptage et d'écriture qui requièrent un minimum d'espace pour bien s'initier ».

*Monsieur Moussa Ndiaye*

#### • L'Animatrice polyvalente du centre d'éveil



« La construction d'un nouveau centre plus spacieux et équipé de tables bancs mieux adaptées nous donne le privilège de travailler avec les enfants de 3 – 6 ans dans de meilleures conditions.

Certaines compétences telles que l'expression graphique, intellectuelle et socio - affective et aussi l'acquisition du langage sont mieux développées. Les enfants du centre, leurs parents et nous encadreurs promettons d'user de toutes nos possibilités pour la pérennité de l'ouvrage et des équipements ».

*Madame Al Diouf Mbaye*
