


Rapport de résultats et d'impact

« Construction d'une unité de survie et de développement de l'enfant à Gouana au Mali »

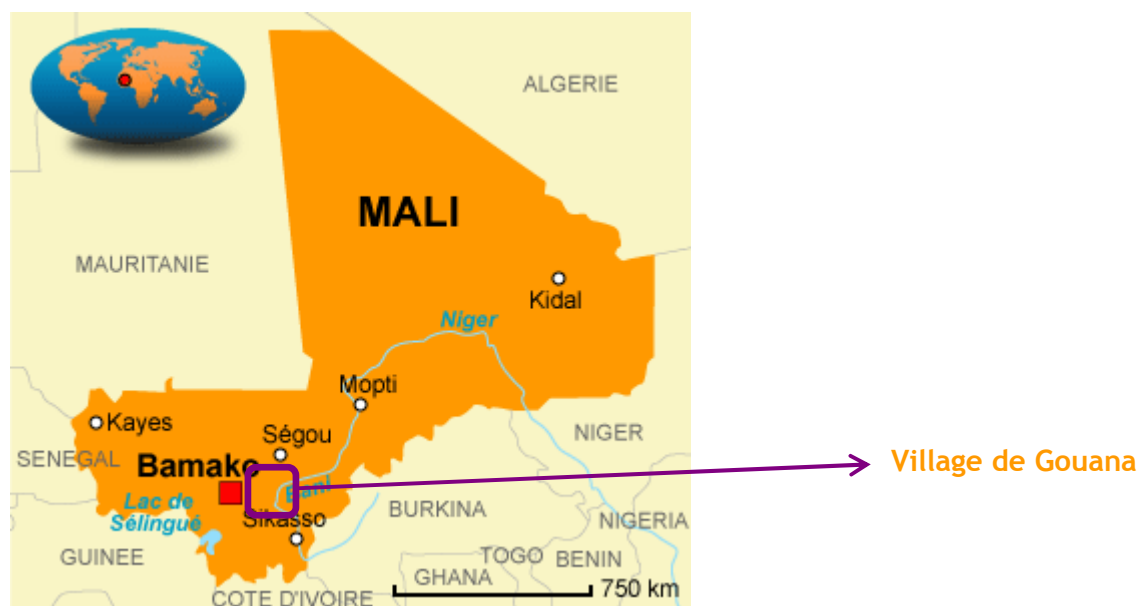

Carte du Mali

Localisation :	Village de Gouana dans la commune de Guégnéka, préfecture de Dioïla, région de Koulikoro, à 133 km à l'est de Bamako
Début du projet :	Juin 2010
Durée du projet :	6 mois
Objectif :	Lutter contre la malnutrition infantile et permettre aux enfants de 3 à 5 ans d'accéder à l'éducation préscolaire.
Nombre de bénéficiaires :	160 enfants de moins de 5 ans et 123 femmes
Budget :	13 260 €

1. Rappel du contexte du projet

Localisation du projet

Le projet s'est déroulé à Gouana, un village de la commune de Guégnéka, dans la région de Koulikoro, au Mali. Le village de Gouana est situé à 20 kilomètres de Fana, chef-lieu de la commune, et à environ 133 km à l'est de Bamako. Il fait partie du programme Bendougou, soutenu par Un Enfant Par La Main.

Il comprend un total de 619 habitants (319 femmes et 300 hommes). Les enfants de moins de 5 ans sont au nombre de 160 (74 filles et 86 garçons) et 95 ont de 3 à 5 ans (44 filles et 51 garçons).

Les activités principales pratiquées dans cette région sont l'agriculture, l'artisanat et le commerce de proximité.

Contexte du projet

Comme toutes les zones rurales maliennes, le village de Gouana est sévèrement affecté par des problèmes de malnutrition infantile. Selon une étude menée en 2001, 38,2 % des enfants âgés de moins de 5 ans souffraient de malnutrition chronique (retard de croissance) au Mali. Et cette situation ne s'améliorait pas car les autorités sanitaires maliennes n'ont pas les moyens financiers de mettre en place les structures adaptées pour pallier au problème.



Pour les habitants de Gouana, le Centre de Santé Communautaire de Fana est trop éloigné (20 km) pour s'y rendre régulièrement. Afin de remédier à cette situation, deux équipes de santé locales ont donc été nommées pour se déplacer régulièrement dans les villages et identifier les enfants victimes de malnutrition.

Mais à Gouana, elles n'avaient pas de local spécifique ni d'équipement adéquat pour mener ces activités correctement. La construction de l'Unité de Survie et de Développement de l'Enfant (USDE) était donc indispensable pour permettre l'amélioration des conditions sanitaires des enfants du village.

Le manque d'infrastructures dédiées à l'éducation préscolaire représentait également un problème majeur à Gouana.

Le projet touchait deux de nos domaines d'intervention : la nutrition et l'éducation.

2. Rappel des objectifs du projet

Les objectifs du projet de construction d'une unité de survie et de développement de l'enfant dans le village de Gouana étaient les suivants :

- Améliorer les conditions de santé en réduisant la malnutrition parmi les femmes et les enfants de moins de 5 ans;
- Améliorer les conditions de vie des familles en formant les mères à une bonne nutrition
- Réduire la morbidité en apprenant aux mères à soigner les maladies les plus courantes
- Fournir un espace sécurisé pour les enfants de 3 à 5 ans et leur apporter une éducation appropriée.

3. Bénéficiaires

Les 160 enfants de moins de 5 ans (74 filles et 86 garçons) du village de Gouana ainsi que les 123 femmes en âge de procréer (dont 28 sont enceintes), vont bénéficier des retombées positives de la mise en place de l'USDE.

De manière indirecte, c'est la communauté toute entière qui profite du projet, puisque les femmes seront prochainement formées à la préparation de repas équilibrés dont bénéficieront toutes leurs familles.

4. Description et mise en place du projet

Avant même la mise en œuvre du projet, une étude de faisabilité a permis de vérifier sa viabilité et sa pérennité, grâce notamment à des rencontres avec les futurs bénéficiaires.

Une fois le financement acquis, les activités suivantes ont pu être mises en place :

Construction de l'USDE

Des réunions préliminaires ont eu lieu pour impliquer la population locale et les représentants des écoles dans le projet. Entre autres résultats, les autorités du village ont fourni un terrain au sein des limites de l'école primaire du village.

Une étude de faisabilité a été mise en place afin de déterminer le site le plus adapté pour la construction dans le village de Gouana. Ceci a été mis en œuvre en collaboration avec l'ingénieur chargé de la construction.

Un appel d'offres a été lancé auprès des entreprises locales (de la préfecture de Dioïla) et le choix de l'entreprise de construction a été fait au niveau du Bureau National avec les chefs des Unités de Développement. Un contrat a été signé avec l'entreprise « M'Piè SANGARE », qui a construit l'USDE ; le chantier s'est achevé en décembre 2010.

La supervision et le suivi des travaux ont été effectués aussi bien au niveau des unités de développement qu'au niveau du bureau national. Un ingénieur était en charge de la supervision et de l'évaluation de l'avancement des travaux. D'autre part, un technicien, basé sur le site de construction en permanence, permettait un suivi efficace des travaux.



Les premiers murs de l'USDE sont construits

Composition de l'USDE

- Un bâtiment rectangulaire (6x7m) destiné aux sessions de nutrition et à l'éducation des enfants
- Une réserve (3x4m) pour stocker l'équipement médical et ludique
- Des toilettes qui seront nettoyées tous les jours, garantissant une bonne hygiène aux enfants
- Un préau (4x10m) où les enfants peuvent jouer tout en restant abrités et où des sessions de démonstrations nutritionnelles peuvent être mises en place
- Une clôture qui permet de sécuriser le lieu et offre un espace protégé pour les enfants.

Achat des équipements

A l'origine, le financement apporté par Un Enfant Par La Main et ses donateurs concernait également l'équipement médical et éducatif.

Aujourd'hui, l'équipement médical fait partie d'un programme global dit « programme nutritionnel global » suivi par le bureau national BØRNEfonden Mali et qui s'étend sur plusieurs unités de développement et donc plusieurs villages. Des fonds ont été budgétés au niveau de chaque unité de développement afin de répondre à son fonctionnement. Les activités nutritionnelles qui seront mises en place font donc désormais parties de ce programme.

Concernant l'équipement éducatif, 1 toboggan, 1 tourniquet, 1 balançoire à bascule ont été achetés et ravissent depuis début janvier les enfants. D'autre part, 2 bancs en métal ont été installés sous le préau.

Accueil des enfants et lutte contre la malnutrition

L'accueil des enfants a démarré le 3 Janvier 2011. Comme cela était prévu dans la proposition, 50 enfants âgés de 3 à 5 ans sont accueillis, 4 jours par semaine, de 8 à 11 heures du matin. Les enfants ont une récréation qui dure environ 15 minutes. D'autre part, les enfants reçoivent de la bouillie enrichie, une première façon d'améliorer leur situation nutritionnelle, en attendant la mise en place des activités nutritionnelles.

Pour rappel, les activités nutritionnelles, qui seront prochainement mises en place, sont : la pesée régulière des enfants de moins de 5 ans de tout le village, l'information et la formation des mères et femmes enceintes et les démonstrations culinaires avec préparation et repas pour l'ensemble des bénéficiaires.

Comme, elles font désormais parties intégrantes du programme nutritionnel global de Børnefonden Mali, et étant mises en place conjointement avec celles d'autres villages, les activités nutritionnelles devraient démarrer au troisième trimestre scolaire 2011, soit vers le mois de mai.



Les enfants au sein de la classe d'éveil



Les enfants à la récréation

5. Résultats du projet et bilan

Les bâtiments de l'USDE sont à présent construits et répondent à l'un des objectifs en permettant d'accueillir 50 enfants de 3 à 5 ans pour des activités d'éveil préscolaires, et cela en toute sécurité.



L'entrée de l'USDE - La cours et le manège devant la classe d'éveil (à droite) et la réserve (à gauche)



Le toboggan et la balançoire bascule



Les enfants jouant avec la mère éducatrice

D'autre part, la situation nutritionnelle des 50 enfants accueillis s'améliore progressivement grâce aux goûters à base de nourriture enrichie. Cette situation devrait s'améliorer encore et s'étendre aux autres enfants de moins de 5 ans du village, une fois que les autres activités nutritionnelles auront démarré.

Une fois le démarrage de ces activités, des informations supplémentaires viendront compléter ce rapport sur les résultats et l'impact de la mise en place de micro-projet.

6. Difficultés rencontrées

Aucune difficulté n'a été rencontrée dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

7. Pérennité du projet

L'unité de survie et de développement de l'enfant est sous la direction du comité de gestion de l'école de Gouana.

Dans un premier temps, l'USDE sera gérée par deux mères éducatrices, formées et choisies par le Centre d'animation pédagogique de Fana, qui est l'institution locale décentralisée en charge des questions éducatives.

Dans un deuxième temps, une enseignante expérimentée sera nommée et rémunérée par le centre d'animation pédagogique de Fana pour diriger l'USDE. Elle se formera au poste de directrice de l'USDE pendant un ou deux mois avec les mères éducatrices : toutes trois recevront une formation sur la façon de gérer une classe d'éveil préscolaire et un programme approprié leur sera donné, sous la direction du comité de gestion de l'école. A l'issue de ce délai, une évaluation permettra de déterminer laquelle des deux mères éducatrices continuera. Elle deviendra l'assistante de l'enseignante, devenue elle-même directrice de l'USDE.

Afin de renforcer leurs capacités d'encadrement et d'éveil des enfants, d'apprendre de nouveaux jeux et astuces d'organisations, des formations seront proposées à la directrice ainsi qu'à la mère éducatrice.

Des sessions de surveillance nutritionnelle seront organisées en collaboration avec les services de santé locaux pour suivre la santé nutritionnelle de 0 à 5 ans, à partir du troisième trimestre 2011.

8. Budget du projet

A l'origine, le budget pris en charge par Un Enfant Par La Main ne comprenait ni la construction de la clôture, ni l'achat des équipements. Mais au vu du succès suscité par ce micro-projet, nous avons proposé à Børnefonden Mali de prendre en charge ces deux postes. Le budget total du projet est donc passé de 9 965€ à 13 260€. Le montant transféré était donc de 10 608€. Voici ci-dessous un tableau reprenant le budget prévisionnel.

DEPENSES		
	Activité	Budget prévisionnel USDE
1	Bâtiment central de l'USDE et réserve	5 011 €
2	Clôture de l'USDE	1 862 €
3	Préau pour les enfants lors de leurs jeux	1 730 €
4	Toilettes	853 €
5	Frais de suivi et de supervision par un ingénieur	378 €
6	Equipement médical	316 €
7	Equipement éducatif	457 €
Sous-total		10 608 €
Frais administratifs, de coordination et de communication (20%)		2 652 €
Budget total		13 260 €

RECETTES			
Source de financement	Montant demandé	%	Financement acquis
Conseil Général du Val de Marne	3 500 €	26.4%	3 500 €
Fondation Bel	2 965 €	22.4%	2 965 €
Fondation BNP-Paribas	3 500 €	11.3%	1 500 €
Coudémail		11.3%	1 500 €
Fondation Vacances Bleues		7.5%	1 000 €
Donateurs UEPLM		21.1%	2 795 €
Budget total	9 965 €	100.0%	13 260 €

DESIGNATIONS	BUDGET		REALISE		DIFFERENCE	
	FCFA	€	FCFA	€	FCFA	€
Construction de la salle de classe/bâtiment central (6x7m) et du magasin	3 283 720	5 011	3 722 500	5 675	438 780	664
Construction de l'enceinte	1 220 260	1 862	1 194 500	1 821	-25 760	-41
Construction du préau pour les jeux et les sessions nutritionnelles	1 133 460	1 730	1 116 650	1 702	-16 810	-28
Construction de la latrine	558 875	853	406 650	620	-152 225	-233
Total USDE	6 196 315	9 456	6 440 300	9 818	243 985	362
Contrôle du travail de terrain et ingénierie	247 853	378	322 015	491	74 162	113
Equipement - équipements médicaux	207 499	316			-207 499	-316
Equipements - éducatifs et jeux en plein air	300 000	457	139 514	213	-160 486	-245
Total fonds transférés	6 951 667	10 608	6 901 829	10 522	-49 838	-86

Comme indiqué dans le budget ci-dessus, un montant de 9 456 € avait été prévu pour les frais de construction, en se basant sur les prix standards collectés au moment de la conception du projet (Juillet 2009) en collaboration avec l'ingénieur en bâtiment. Après réception des fonds (Juillet 2010), le contrat de construction a été réévalué à 9 818 € et tient compte des nouveaux prix du marché. Une différence de 362 € a été constatée.

Pour la partie « contrôle et ingénierie du terrain », les coûts sont calculés en fonction d'un contrat annuel signée avec le bureau des ouvriers du bâtiment pour le suivi de toutes les constructions effectuées avec BØRNEfonden. Le montant à payer dépend du nombre d'ouvrages évalués sur la base du contrat signé. En plus de l'augmentation du montant du contrat, le pourcentage des frais de contrôle et d'ingénierie du terrain, négocié à 4%, est passé à 5%. Tout cela a contribué à l'augmentation du poste « contrôle du terrain et ingénierie ».

Les différentes augmentations ont affecté le montant prévu pour les équipements, même si les équipements médicaux sont désormais pris en charge dans le projet global de nutrition. Par conséquent, un montant égal à 213 € restait pour cet usage et il a été utilisé pour compléter l'achat des équipements scolaires. La différence a été prise en charge par l'unité de développement 718, dont dépend le village de Gouana.

Enfin une différence total de 86€ apparaît, il s'agit des frais de transfert.

9. Remerciements

Merci à tous les donateurs qui ont permis la mise en place de ce micro-projet dont parmi eux :

- le Conseil Général du Val de Marne, la Fondation Bel, la Fondation BNP Paribas,
- la Fondation Vacances Bleues, l'entreprise Coudémail et le comité d'entreprise GIE Cibama,
- la troupe des Chérubins Stars et les scouts et guide de France.



Les enfants dans leur classe d'éveil joliment décorée
